

PLAN DE CONTINGENCIA

CONSERVACION ESCUELA RURAL BAHIA LINAO

Mediante el presente la Comunidad Educativa de la Escuela Rural Bahía Linao, se permite manifestar lo siguiente:

1. Que de acuerdo a la información recibida nuestra comunidad educativa se encuentra en conocimiento del Proyecto de Conservación del Establecimiento que se ha presentado al Ministerio de educación, manifestando nuestra conformidad con él.
2. Durante la ejecución de las obras, con el objetivo de que el desarrollo de estas no afecten el normal funcionamiento de las actividades pedagógicas, y seguridad de los alumnos y alumnas del establecimiento, se plantea programar los procesos de licitación y ejecución en los periodos que cuyo desarrollo no impacten el desarrollo normal de las actividades pedagógicas del establecimiento.

Según lo planteado precedentemente, se propone desarrollar el proceso de licitación, adjudicación y firma de contrato, en el mes de febrero. Los procesos señalados no afectan de ninguna manera la jornada escolar y actividades pedagógicas del establecimiento en cuestión, en razón que estas actividades indicadas (licitación, adjudicación y firma de contrato) se desarrollan por la Unidad Técnica en la Corporación Municipal de Ancud.

Del proceso de entrega de terreno y luego desarrollo de la ejecución de la obra se propone que se den inicio en el mes de febrero, cuyo tiempo de desarrollo de la obra sería de 46 días corridos máximo.

El objetivo de esto es programar que durante los periodos que no hay desarrollo de clases (enero-febrero), se ejecute el mayor porcentaje de avance de la obra, dejando para el mes de marzo y abril las obras o partidas que requieran intervención en el exterior del establecimiento o que puedan ejecutarse después del horario de la jornada escolar (de lunes a viernes), como por ejemplo: El trabajo en oficinas, el aseo de la obra y el retiro de los escombros que permanezcan en el establecimiento.

La propuesta de programación de obras sería:

MES	% AVANCE DE OBRA
FEBRERO 2021	60%
MARZO 2021	30%
ABRIL 2021	10%
TOTAL	100%

- De la programación de obras propuesto y respecto de las obras que se realicen durante el periodo de permanencia de los alumnos y alumnas en este establecimiento se detallan a continuación las partidas a intervenir, como así también las partidas que se ejecutarán en los periodos que no hay desarrollo de clases:

MES	% DE AVANCE OBRA	JORNADA CLASES LICEO	JORNADA TRABAJO EMPRESA CONTRATISTA	NOMBRE PARTIDA
FEBRERO 2021	60%	VACACIONES	Según jornada laboral	1.7.1 Instalación De Faenas Y Dependencias Provisorias 1.7.2 Letrero De Obra 2.0 Intervenciones En Aulas Y Talleres 5.0 Intervenciones En SSHH 6.0 Intervenciones En Circulaciones
MARZO 2021	30%	LUNES A JUEVES 8:00 a 17:00 VIERNES 8:00 a 14:00	VIERNES 14:30 a 22:00	3.0 Intervenciones En Oficinas 4.0 Intervenciones En Sala De Profesores 7.0 Intervenciones En Comedor Y Casino
ABRIL 2021	10%	LUNES A JUEVES 8:00 a 17:00 VIERNES 8:00 a 14:00	VIERNES 14:30 a 22:00	1.7.3 Aseo De La Obra 1.7.4 Retiro De Escombros 1.7.5 Entrega Final De La Obra

3. Complementariamente a la Unidad Técnica, la Dirección del establecimiento y el prevencionista de Riesgos de la Corporación Municipal de Ancud, coordinaran con la empresa contratista:

- La programación de la ejecución de las obras señaladas según lo señalado precedentemente
- Solicitará Plan de mitigación a la empresa contratista una vez firmado el contrato, de manera de poder ser visado por la Unidad Técnica y coordinado con la Dirección del Establecimiento, todo antes de iniciar las obras. El plan de mitigación debe indicar una adecuada administración de los espacios interiores y exteriores a intervenir en periodo de clases, de manera de hacer más eficiente el manejo de los materiales e intervención sobre todo en los recintos interiores cuando se intervengan en los horarios después de clases. En las intervenciones exteriores se deberán considerar cierros opacos provisorios, rutas de acceso a las obras que no tengan contacto con la comunidad escolar, entre otras. Deberá además señalar las medidas de seguridad correspondiente, y aislamiento de las zonas a intervenir, con el objetivo de facilitar y permitir la correcta ejecución del Proyecto de Conservación, sin alterar el funcionamiento de la jornada escolar y sin afectar la seguridad de los estudiantes y funcionarios del establecimiento educacional.


4. Se realizarán además reuniones de socialización del Proyecto con todos los integrantes de la Comunidad Educativa con el objeto de dar a conocer los avances del proyecto.




TERESITA PAREDES AGUILAR
DIRECTORA DE EDUCACIÓN





IRENE HAARMANN RITTER
UNIDAD PLANIFICACION, PROYECTOS Y RECURSOS FISICOS



PABLO GUILLERMO AGÜERO SOTO
Ingeniero en Prevención de Riesgos.
Calidad y Ambiente
N°C/P-032/08

PABLO AGÜERO SOTO
INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE

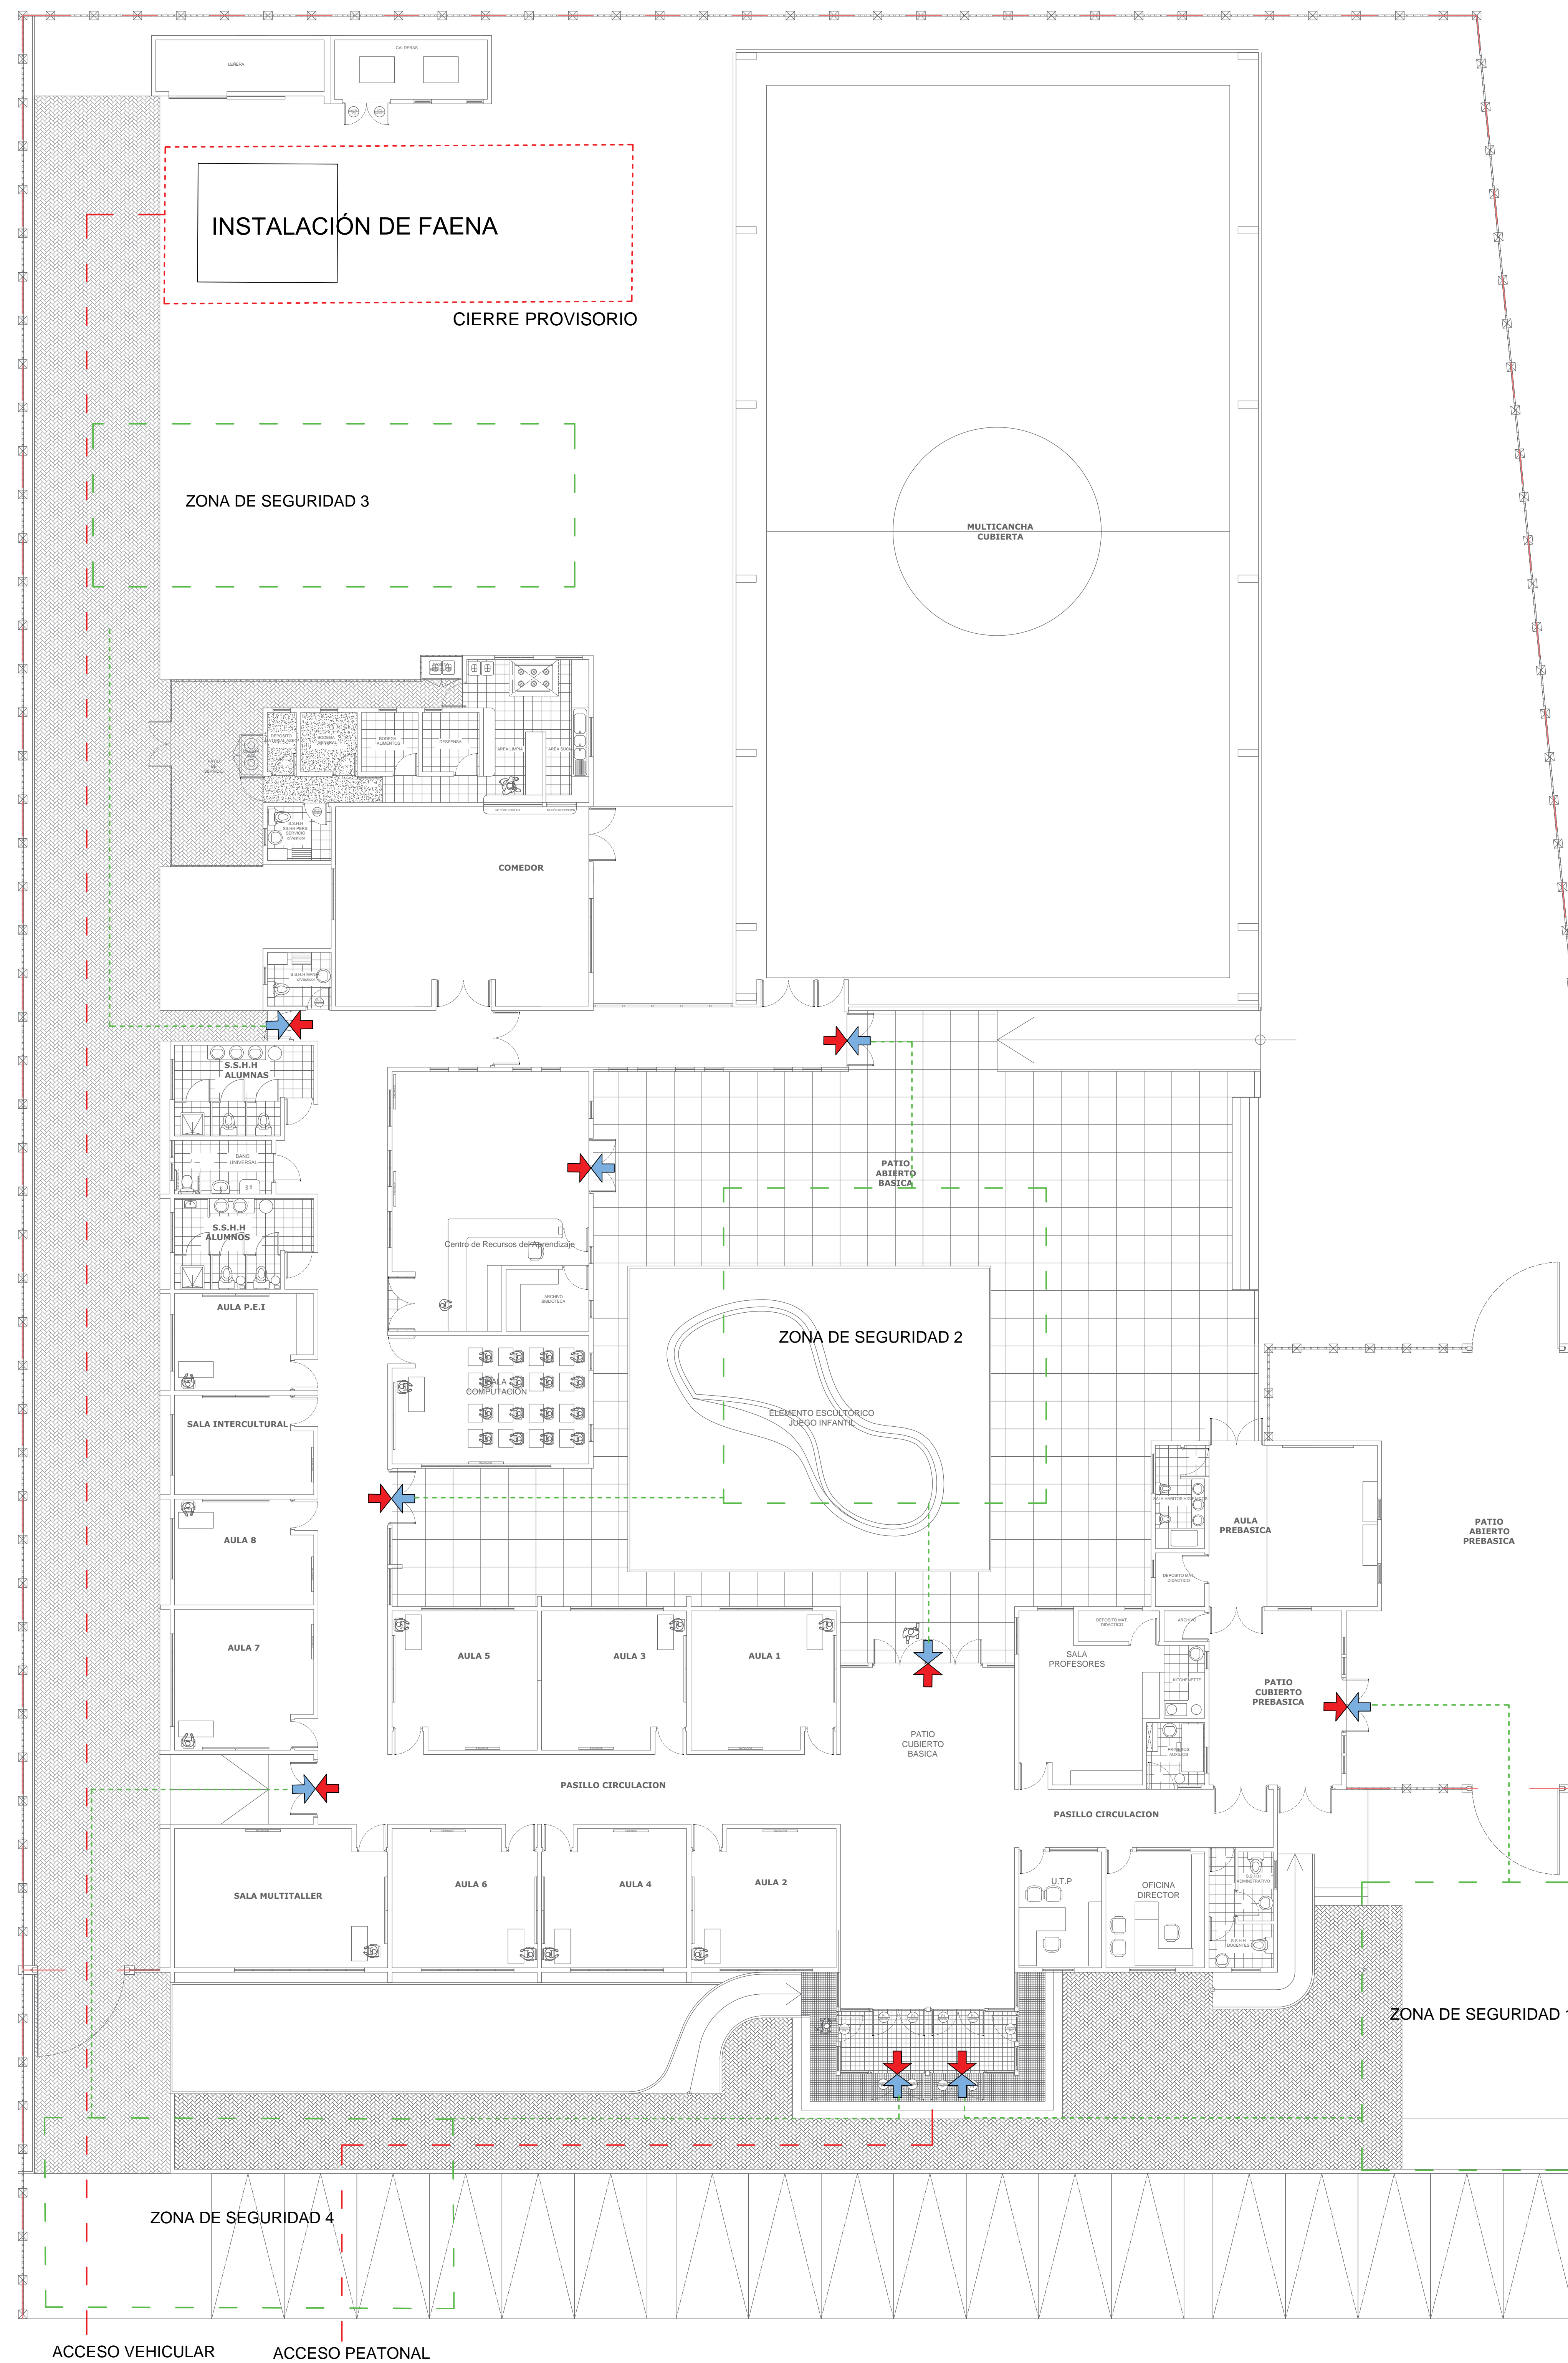

SIMBOLOGIA



PARTIDAS

MES	% DE AVANCE OBRA	JORNADA CLASES LICEO	JORNADA TRABAJO EMPRESA CONTRATISTA	NOMBRE PARTIDA
FEBRERO 2021	70%	VACACIONES	Según jornada laboral	1.7.1 Instalación De Faenas Y Dependencias Provisorias 1.7.2 Letrero De Obra 2.0 Intervenciones En Aulas Y Talleres 5.0 Intervenciones En SSHH 6.0 Intervenciones En Circulaciones
MARZO 2021	20%	LUNES A JUEVES 8:00 a 17:00 VIERNES 8:00 a 14:00	VIERNES 14:30 a 22:00	3.0 Intervenciones En Oficinas 4.0 Intervenciones En Sala De Profesores 7.0 Intervenciones En Comedor Y Casino
ABRIL 2021	10%	LUNES A JUEVES 8:00 a 17:00 VIERNES 8:00 a 14:00	VIERNES 14:30 a 22:00	1.7.3 Aseo De La Obra 1.7.4 Retiro De Escombros 1.7.5 Entrega Final De La Obra

PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MEJOR

N

COMUNA DE ANCUDE

NOTAS

LAS COTAS DEFINIDAS EN PLANOS PREVALECIEN POR SOBRE EL DIBUJO. TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORARAS EN TERRENO. DE EXISTIR DIFERENCIAS SE DEBERA COMUNICAR AL ARQUITECTO QUIEN RESOLVERA EN OBRA.

OBSERVACIONES	FECHA

PROYECTO: CONSERVACION ESCUELA RURAL BAHIA LINAO

UBICACION: SECTOR RURAL LINAO COMUNA DE ANCUDE

SUPERFICIE A INTERVENIR: 845 METROS CUADRADOS

PROPIETARIO: I. Municipalidad de Ancud RUT: 69.230.100-5

REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA: _____

ARQUITECTO:
DAVID ROMÁN GARCÍA GONZÁLEZ
RUT: _____

CONTENIDO LÁMINA: PLAN DE CONTINGENCIA

ESCALAS: 1 / 100

FECHA: NOV / 2020

EDICIÓN: A LÁMINA: 1

VERSIÓN: 001 REVISIÓN INDEPENDIENTE: 1

CODIGO: _____

CEBIL: P/0041 FECHA REVISIÓN: _____ FECHA APLICACIÓN: _____

DEBILANTE: DG

DIRECCIÓN DE OBRAS DE: _____

ARQUITECTO REVISOR: _____ FIRMA: _____
